ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1				
2	EFDR	0d	17 Feb '97	17 Feb '97
3				
4	FM ICU Cards Complete	0d	21 Apr '97	21 Apr '97
5	FM DEM AIV Complete	0d	18 Aug '97	18 Aug '97
6				
7	EM OM1 EMC	4w	31 Mar '97	25 Apr '97
8				
9	QM Manufactured	0d	12 May '97	12 May '97
10	QM BM Integ & Align	8w	12 May '97	4 Jul '97
11	QM BM to Telescope Align	6w	7 Jul '97	15 Aug '97
12	QM to CSL	1w	18 Aug '97	22 Aug '97
13	QM at CSL	0w	22 Aug '97	22 Aug '97
14	QM Tests at CSL	8w	25 Aug '97	17 Oct '97
15	QM Return to MSSL	1w	20 Oct '97	24 Oct '97
16	QM disassemble	2w	27 Oct '97	7 Nov '97
17	FM Manufactured	0d	17 Nov '97	17 Nov '97
18	FM BM Integ & Align	8w	17 Nov '97	9 Jan '98
19	FM BM to Telescope Align	6w	12 Jan '98	20 Feb '98
20	FM to CSL	1w	23 Feb '98	27 Feb '98
21	FM at CSL	0w	27 Feb '98	27 Feb '98
22	FM Tests	8w	2 Mar '98	24 Apr '98
23	FM Delivery to ESA	0w	24 Apr '98	24 Apr '98

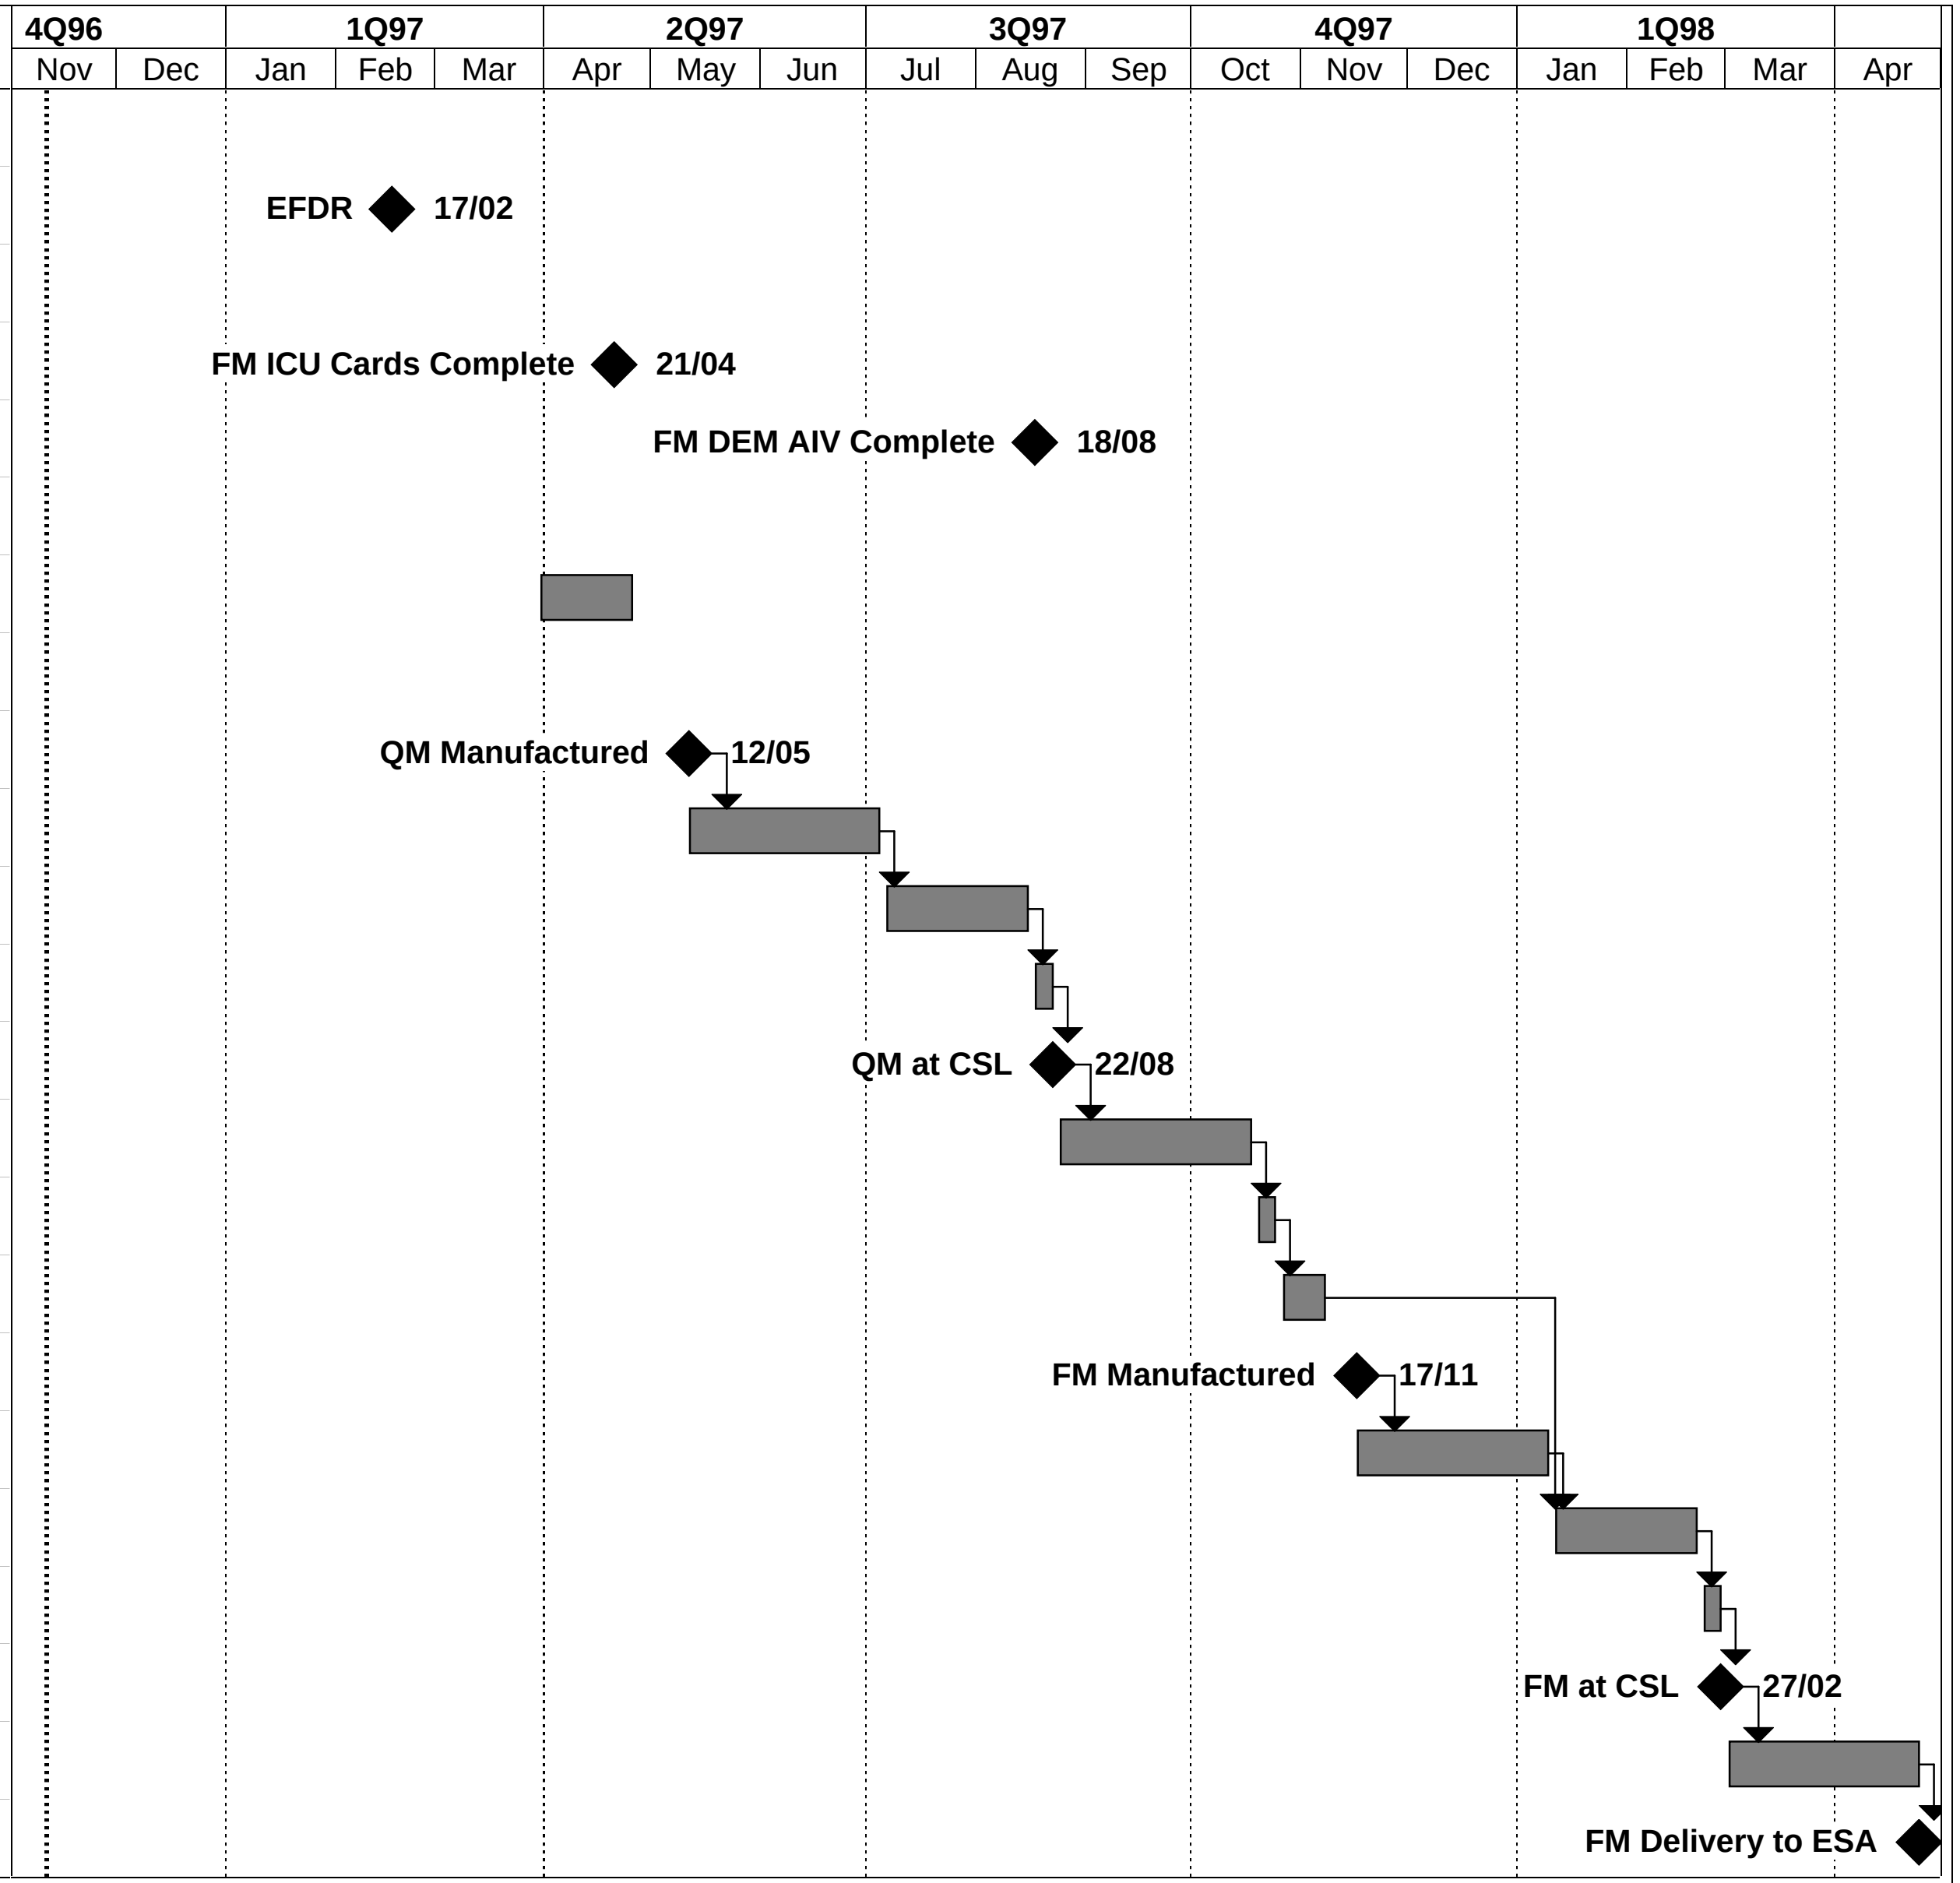

Project: Complete_AIV.MPP
Date: 11 Nov '96

Task		Milestone		Rolled Up Task		Rolled Up Progress	
Progress		Summary		Rolled Up Milestone			
