ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1					
2	**Completed Units**	**17.2w**	**18 Oct '96**	**17 Feb '97**	
3	HV	0d	8 Nov '96	8 Nov '96	
4	BCH	0d	18 Oct '96	18 Oct '96	
5	BPE	0d	28 Dec '96	28 Dec '96	
6	FW&D	0d	1 Nov '96	1 Nov '96	
7	TMPSU	0d	17 Feb '97	17 Feb '97	
8					
9	**Off-Line Integrations**	**9w**	**30 Dec '96**	**28 Feb '97**	
10	b) BCH-BPE	1w	30 Dec '96	3 Jan '97	4,5
11	d) HV-BPE	1w	6 Jan '97	10 Jan '97	3,5,10
12	f) BPE-DPU	1w	13 Jan '97	17 Jan '97	5,11
13	e) BPE-FW&D-TMPSU	1w	17 Feb '97	21 Feb '97	5,6,7,12
14	g) BPE-TMPSU-ICU	1w	24 Feb '97	28 Feb '97	5,6,13
15					
16	**System Integration**	**8w**	**20 Jan '97**	**14 Mar '97**	
17	2) HV-BCH-BPE	1w	20 Jan '97	24 Jan '97	12
18	3) HV-BCH-BPE-TMPSU	1w	3 Mar '97	7 Mar '97	17,14
19	4) HV-BCH-BPE-FW&D-TMPSU	1w	10 Mar '97	14 Mar '97	18

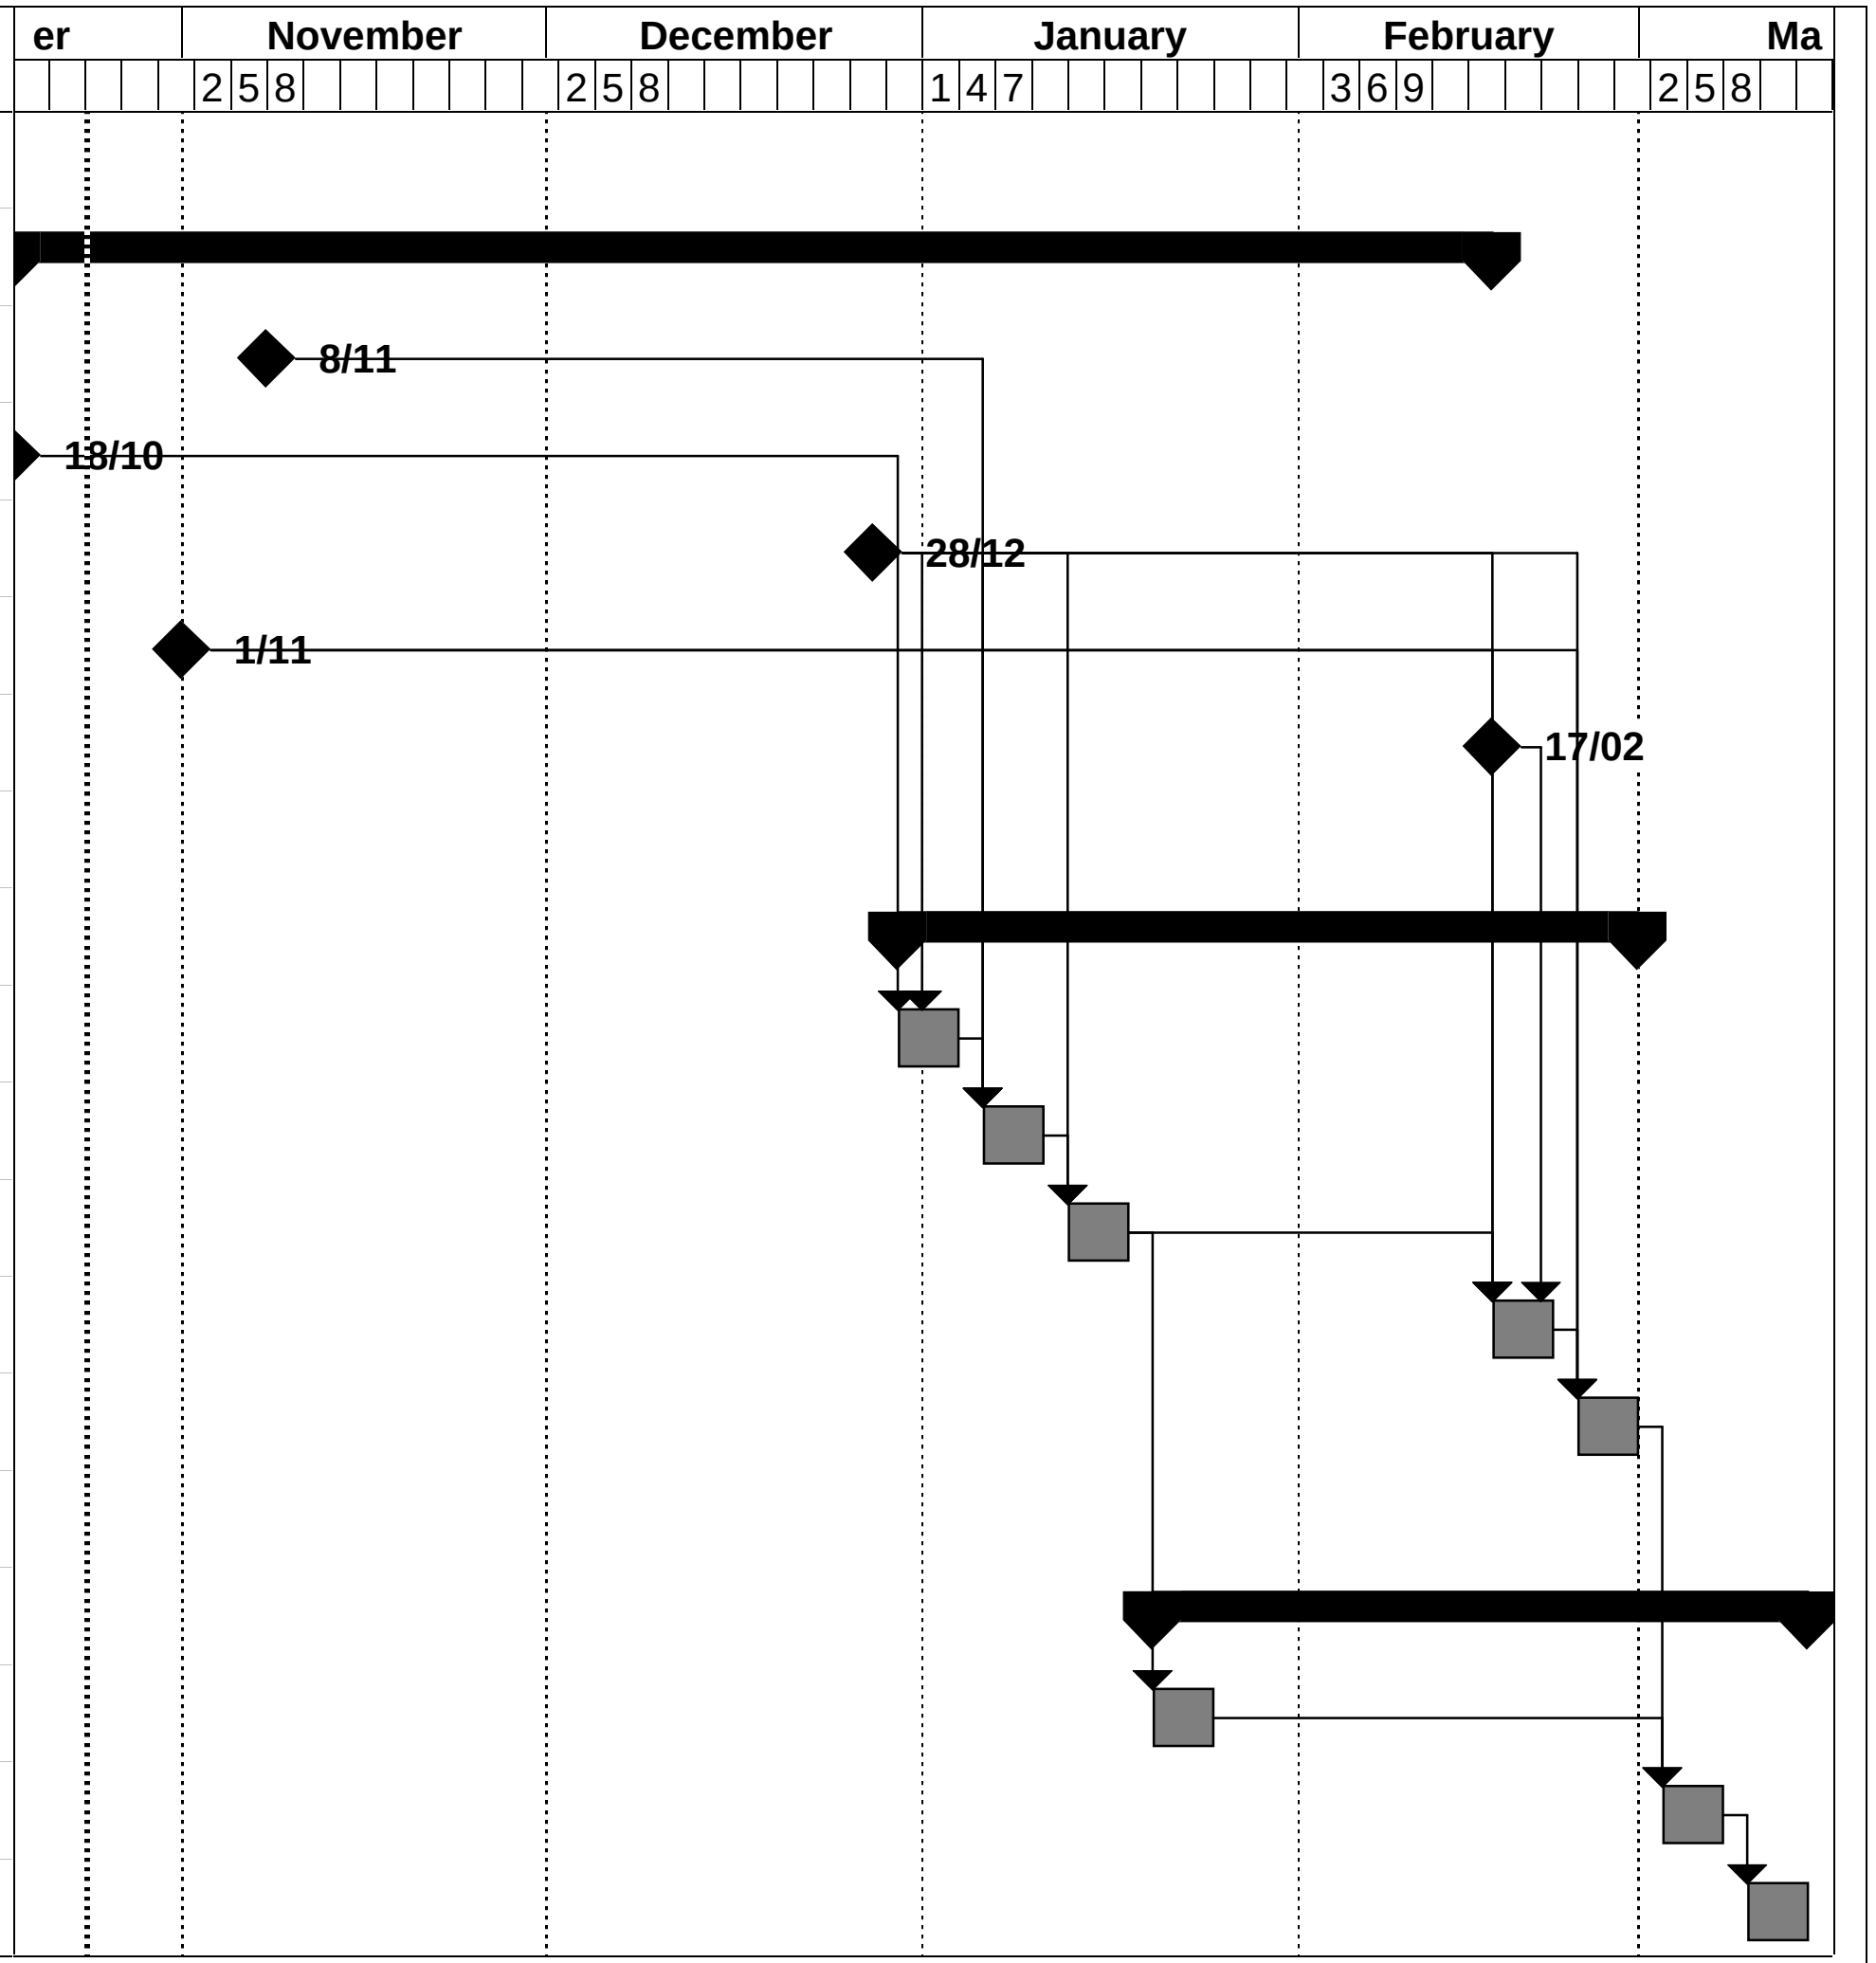

Project: EM OM1 Integration.MPP
Date: 24 Oct '96

Task
Progress
Milestone
Summary
Rolled Up Task
Rolled Up Milestone
Rolled Up Progress
